

TEPF

Présentation des opérations de démantèlement et de réhabilitation des terrains sur l'UdL et sur la concession de Lacq



TOTAL



Points techniques

Focus sur sujets réalisés en 2016

TRAVAUX DÉMANTÈLEMENT UDL (1/7) : 2016

Pavé 2 – Démantèlement des sous-stations
Gaz Brut / Booster avant purge du Lot 96
1,5 mois de travaux / de février à mars 2016
100% réalisé




TRAVAUX DÉMANTÈLEMENT UDL (2/7) : 2016

Pavé 3 – DEM
Sous-station UCO/8K402 + racks
2 mois de travaux de février à avril
2016
100 % réalisé


Pavé 3 – DEM
Ex Salle de contrôle centralisée
3 mois de travaux de octobre à
décembre 2016
100 % réalisé



TRAVAUX DÉMANTÈLEMENT UDL (3/7) : 2016

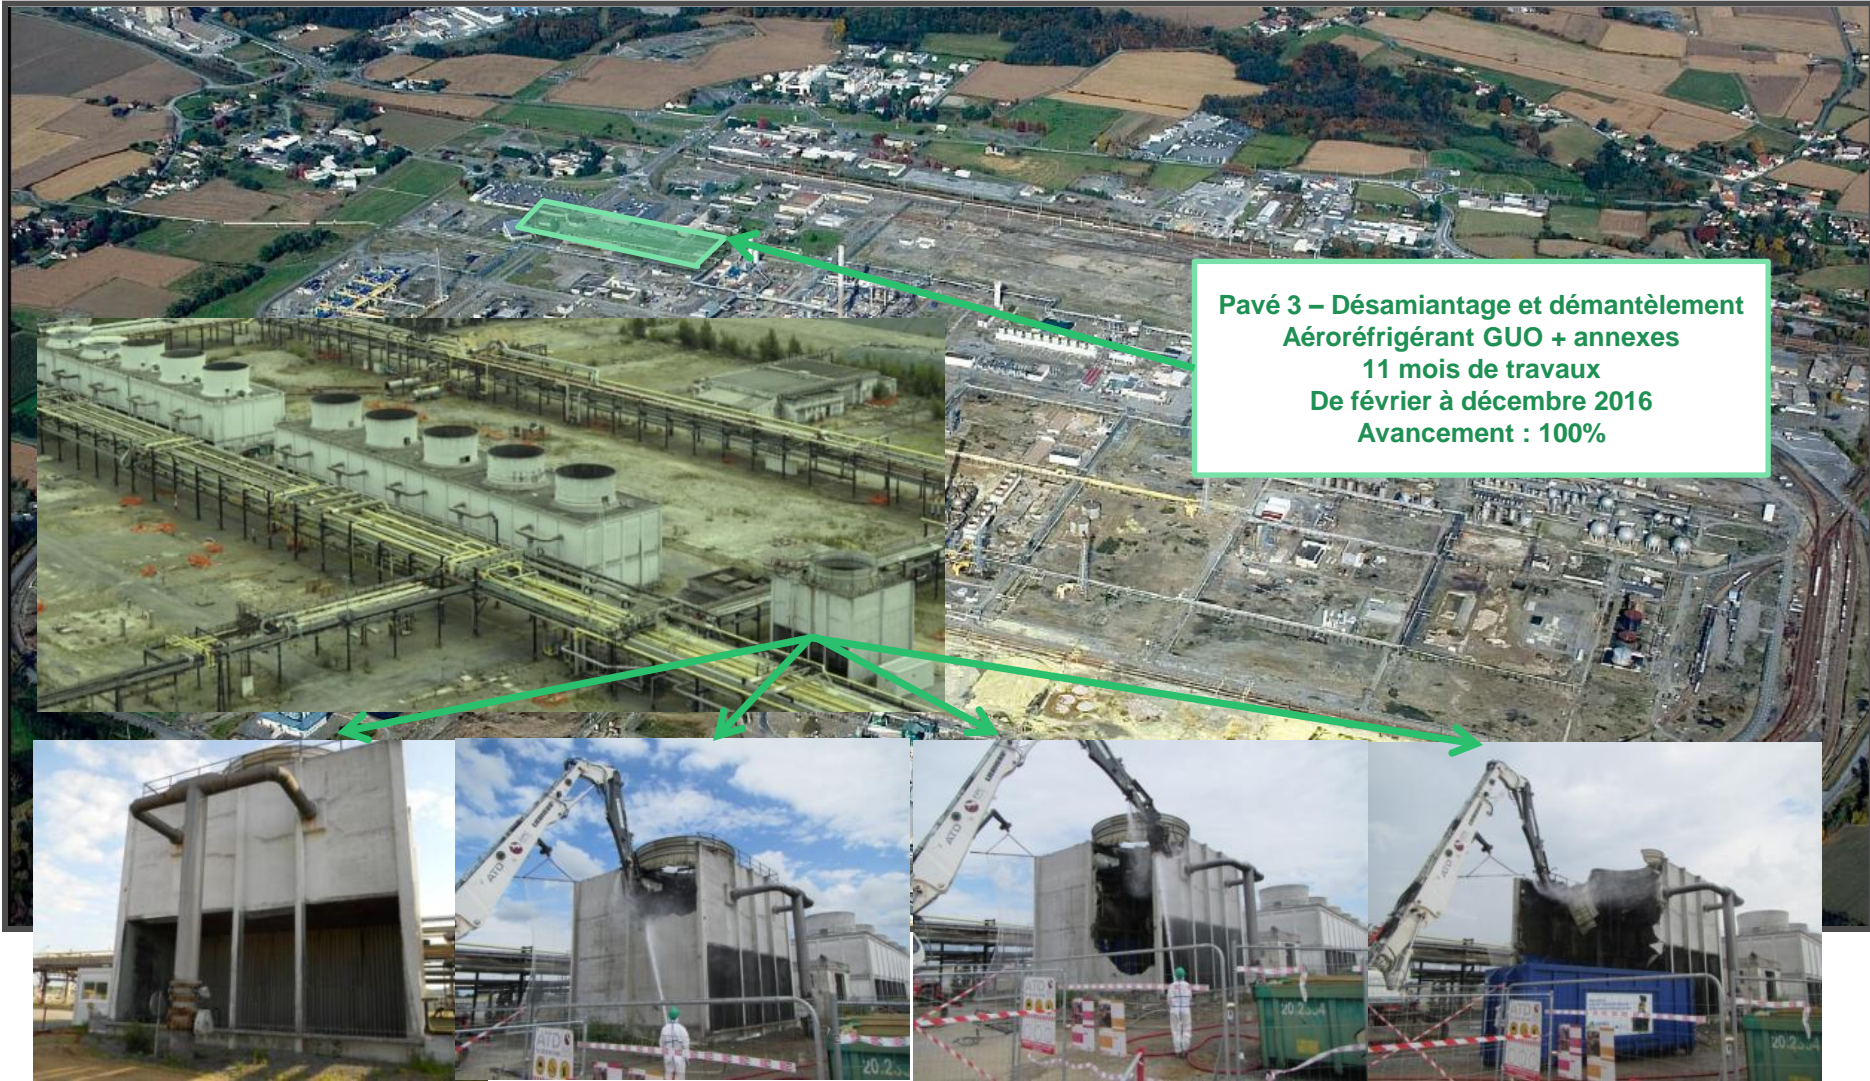

TRAVAUX DÉMANTÈLEMENT UDL (4/7) : 2016



**Pavé 4 – Désamiantage des internes de colonnes
des ex-unités T9/T10 & FW8
2,5 mois de travaux / de aout à décembre 2016
Avancement : 100%**

**Pavé 4 –DEM – Ex-Unités US7&Sulfreen
4,5 mois de travaux
De octobre 2016 à mars 2017
Avancement : 27%**

TRAVAUX DÉMANTÈLEMENT UDL (5/7) : 2016

Pavé 8 – Abattage et démantèlement de la colonne 8C401
1 mois de travaux réalisés sur avril et mai 2016
Budget : 100% réalisé



Pavé 8 – Démantèlement des sous-stations éthylène 2 et dégazolinage
2 mois de travaux
De décembre 2016 à janvier 2017

Pavé 8 – Désamiantage des internes de la colonne 8C401
1,5 mois de travaux / de novembre à décembre 2016

Jointes périphériques et entre plateaux amiantés



TRAVAUX DÉMANTÈLEMENT UDL (6/7) : 2016

Pavé 5 – Démantèlement unité T12
3,5 mois de travaux
De janvier à avril 2016
100% réalisé



Pavé 5 – Désamiantage des jupes de colonnes T12
4 mois de travaux / de juillet à novembre 2016
Avancement : 100%



TRAVAUX DÉMANTÈLEMENT UDL (7/7) : 2016

Hors pavés – Démantèlement
divers équip.sur la zone soufre
3 mois de travaux
De mars à juin 2016
100% réalisé



Avancement UDL à fin 2016

► Avancement démantèlement :

- Surface totale à démanteler : 25 ha
 - Dont déjà démantelée : 15 ha soit 60 %
 - Dont restant à démanteler : 10 ha soit 40 %

► Avancement état des lieux environnemental (diagnostic) :

- Surface totale à diagnostiquer : 71 ha
 - Dont déjà diagnostiquée : 45 ha soit 63%
 - Dont restant à diagnostiquer : 26 ha soit 37 %

► Réhabilitation :


- Surface totale à réhabiliter : 71 ha
 - Dont déjà réhabilitée : 23 ha soit 32 %
 - Dont restant à réhabiliter : 48 ha soit 68 %



Points techniques


Focus sur sujets d'actualité 2017

TRAVAUX DÉMANTÈLEMENT UDL : RÉALISATIONS T1-2017

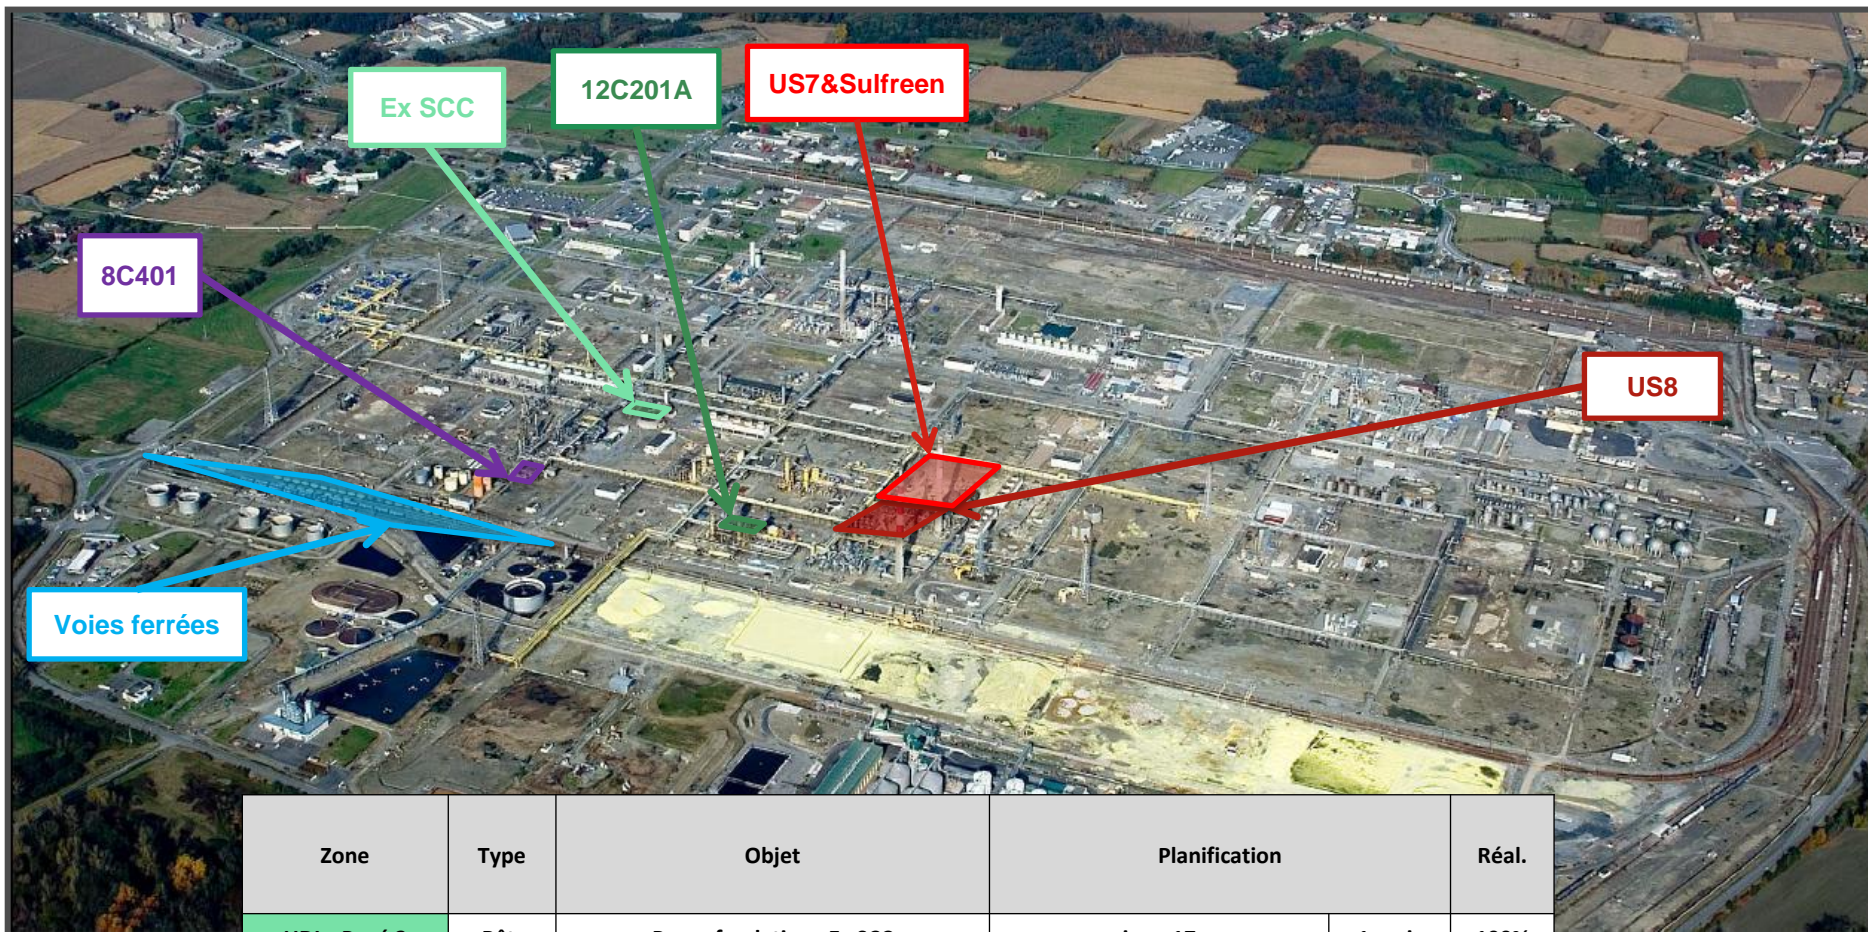


Zone	Type	Objet	Planification		Réal.
UDL - Pavé 3	Bât.	Purge fondations Ex SCC	janv-17	1 mois	100%
UDL - Pavé 4	Unité	DEM US7-SULFREEN	décem. 2016 à avril 2017	5 mois	95%
UDL - Pavé 4	Unité	DEM US8	févr. à fin juin 2017	5 mois	25%
UDL - Pavé 5	Unité	DES Internes colonne 12C201A	janv-17	1 mois	100%
UDL - Pavé 7	Unité	DEM Voies ferrées et local floculation	mars à mi-avril 2017	1,5 mois	90%
UDL - Pavé 8	Unité	DES Internes colonne 8C401	mi-janv. et févr. 2017	1,5 mois	100%

TRAVAUX DÉMANTÈLEMENT UDL : RESTE À FAIRE 2017

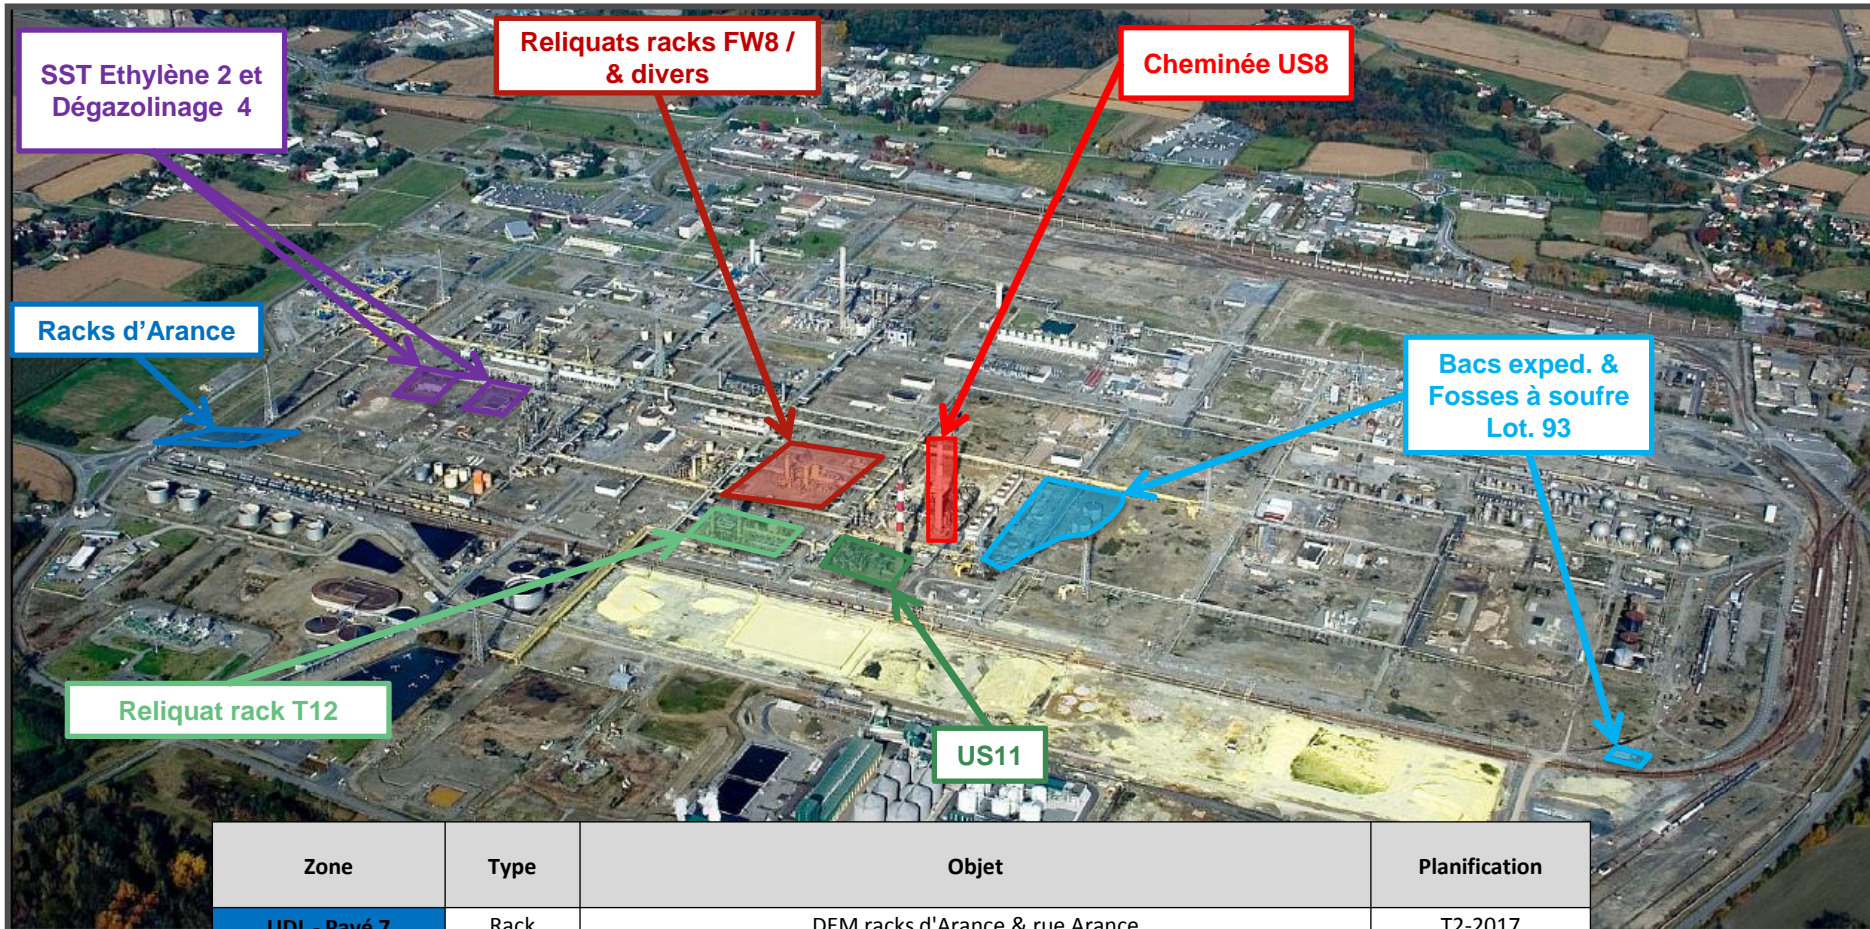


Zone	Type	Objet	Planification
UDL - Pavé 7	Rack	DEM racks d'Arance & rue Arance	T2-2017
UDL - Pavé 6	Unité	DES-DEM Fosse à Soufre - K4801 - Bacs Exped - lot 93	T2/T3-2017
UDL - Pavé 8	Bât	DEM SST Dégazolinage 4 & Ethylène 2	T2/T3-2017
UDL - Pavé 5	Unité	DES-DEM US11	T3-2017
UDL - Pavé 5	Rack	DEM reliquat rack T12	T4-2017
UDL - Pavé 4	Autre	DEM Cheminée US8	T4-2017
UDL - Pavé 4	Rack	DEM reliquats racks FW8 /K8002E/9D219	T4-2017

TRAVAUX DÉMANTÈLEMENT UDL : PROGRAMME 2018

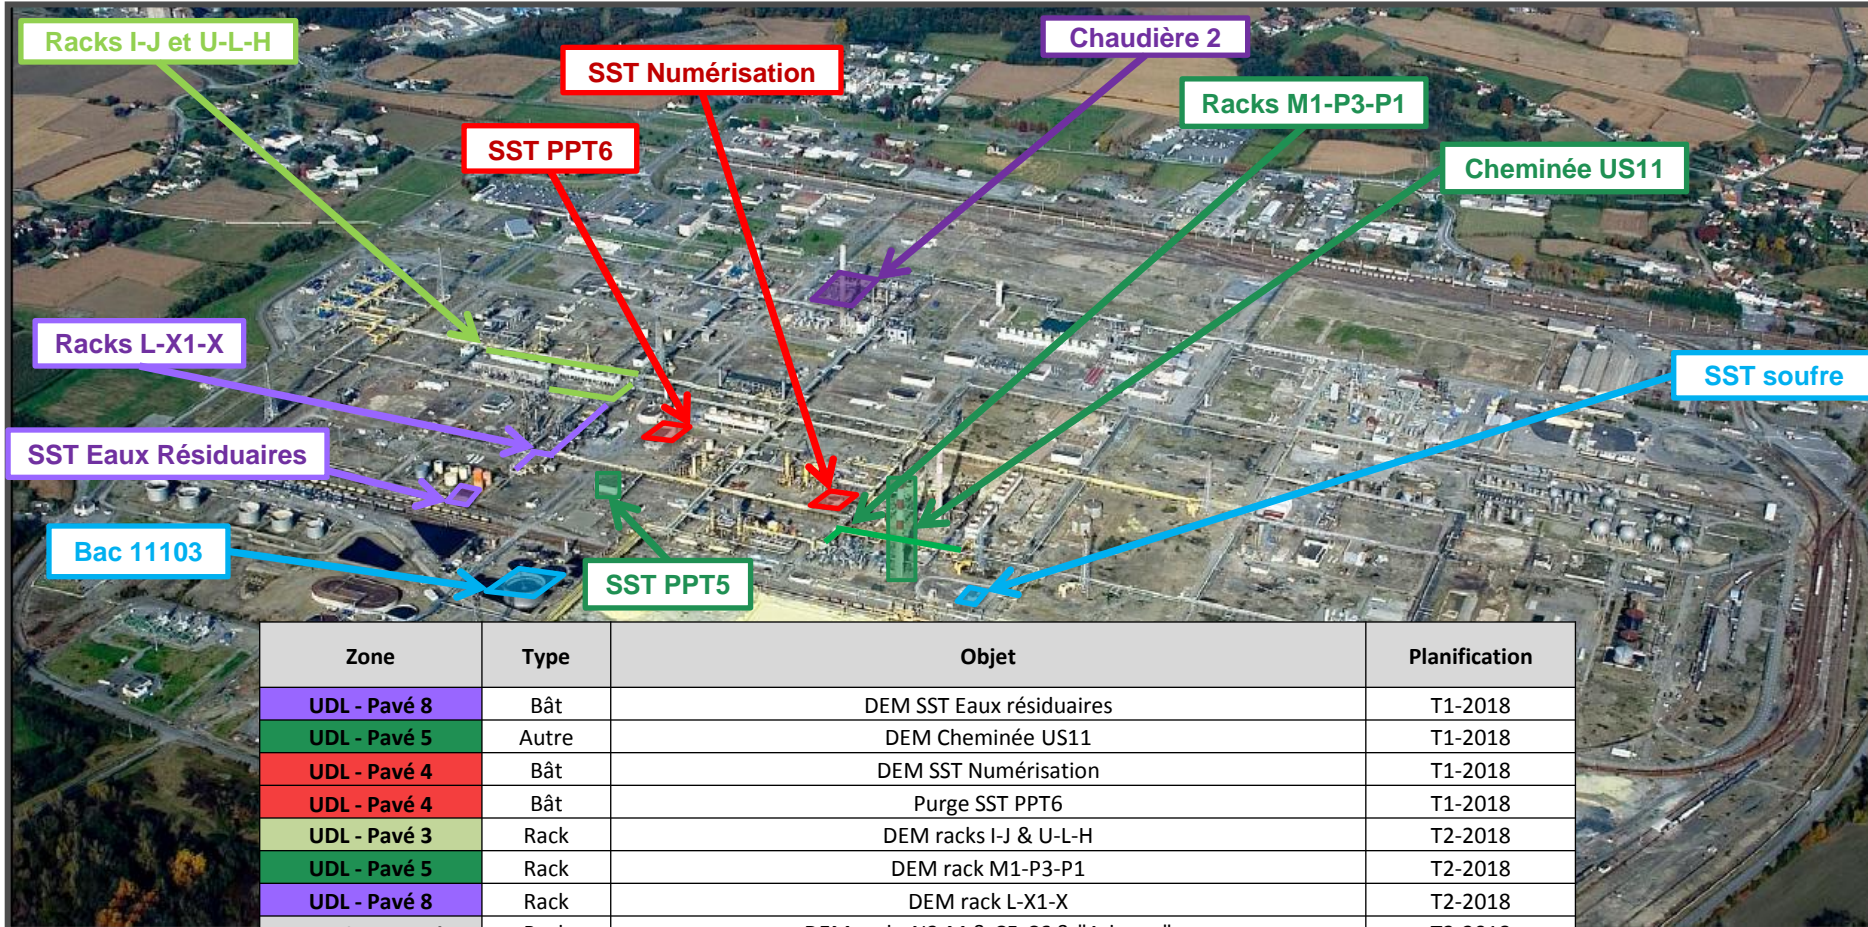

Zone	Type	Objet	Planification
UDL - Pavé 8	Bât	DEM SST Eau résiduaire	T1-2018
UDL - Pavé 5	Autre	DEM Cheminée US11	T1-2018
UDL - Pavé 4	Bât	DEM SST Numérisation	T1-2018
UDL - Pavé 4	Bât	Purge SST PPT6	T1-2018
UDL - Pavé 3	Rack	DEM racks I-J & U-L-H	T2-2018
UDL - Pavé 5	Rack	DEM rack M1-P3-P1	T2-2018
UDL - Pavé 8	Rack	DEM rack L-X1-X	T2-2018
UDL - hors pavés	Rack	DEM racks N2-M & C5-C6 & "Arkema"	T2-2018
UDL - Pavé 5	Bât	DEM SST PPT5	T2-2018
UDL - Pavé 6	Bât	DEM SST Soufre	T2-2018
UDL - Pavé 1	Unité	DES-DEM Chaudière 2	T2/T3-2018
UDL	Déchets	Traitement ensemble à brides avec joints @miantés	T3-2018
UDL	Déchets	Traitement brides à boisseau fermé (gaz)	T3-2018
UDL - Pavé 6	Unité	DEM T11103	T4-2018
UDL - Pavé 6	Déchets	Elim. contenu T11103	T4-2018
UDL	Bât	DEM petits bâtiments et actifs divers	2018

UDL – Réhabilitation – Diagnostics

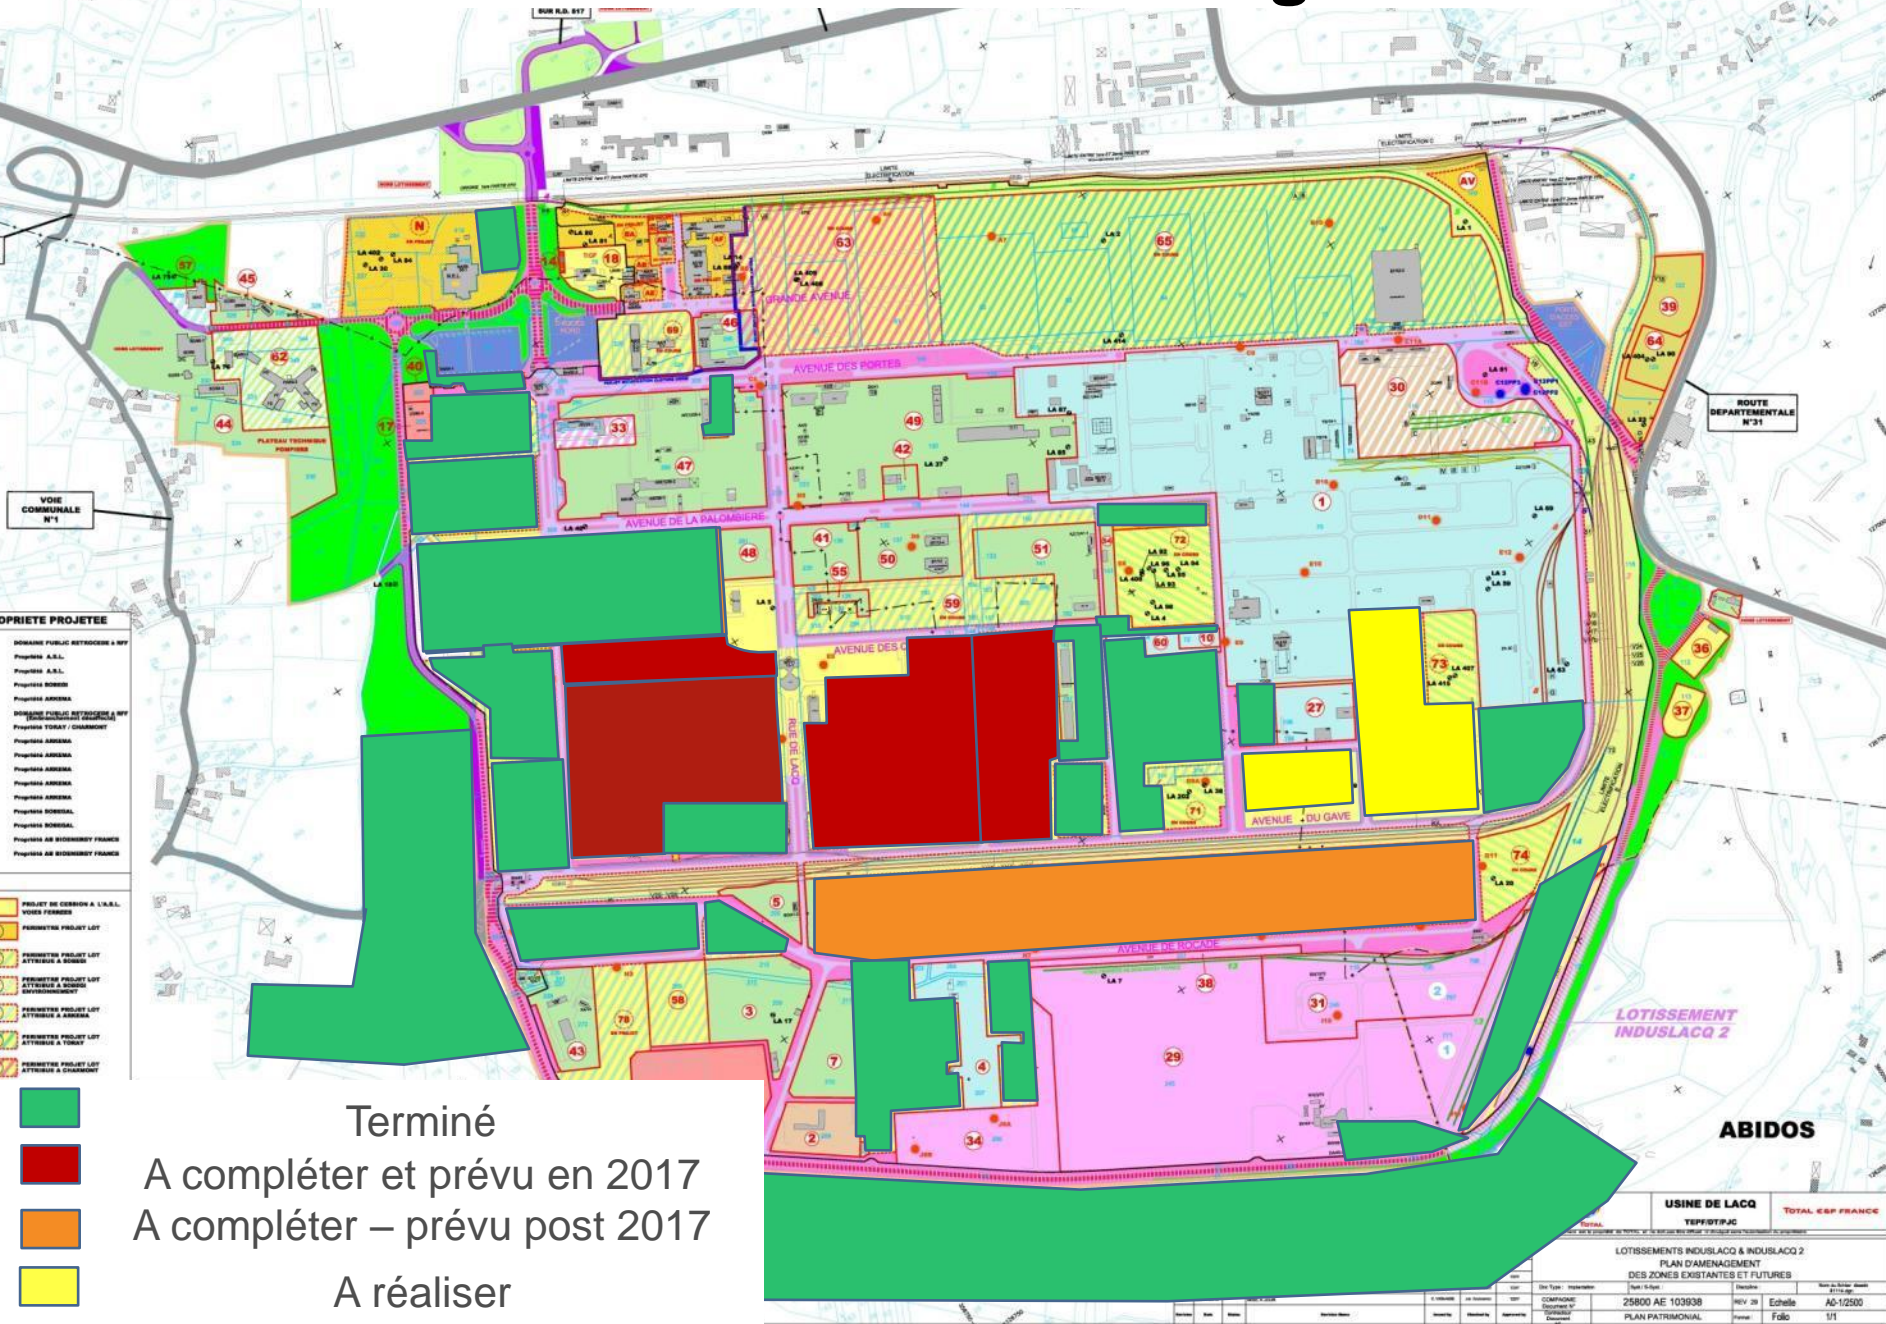

UDL – Réhabilitation – Travaux (1/3)

► Lots TOTAL SA


- Arrêté Préfectoral reçu le 6 avril 2016
- Réhabilitation :
 - Entreprise retenue: SECHE Eco SERVICES
 - Travaux en cours, délai sur le planning car volumes impactés supplémentaires
 - Priorisation de libération du lot 96 pour essais de lâcher de gaz de TSA en juin
 - Fin prévue: Juillet 2017



UDL – Réhabilitation – Travaux (2/3)

Sud-Ouest usine

- Réhabilitation du lot CD
 - AP reçu le 23/02/17
 - Entreprise retenue: SOLEO Services
 - Démarrage des travaux le 04/04/17
 - Intégration de l'extension sous les voies ferrées au nord

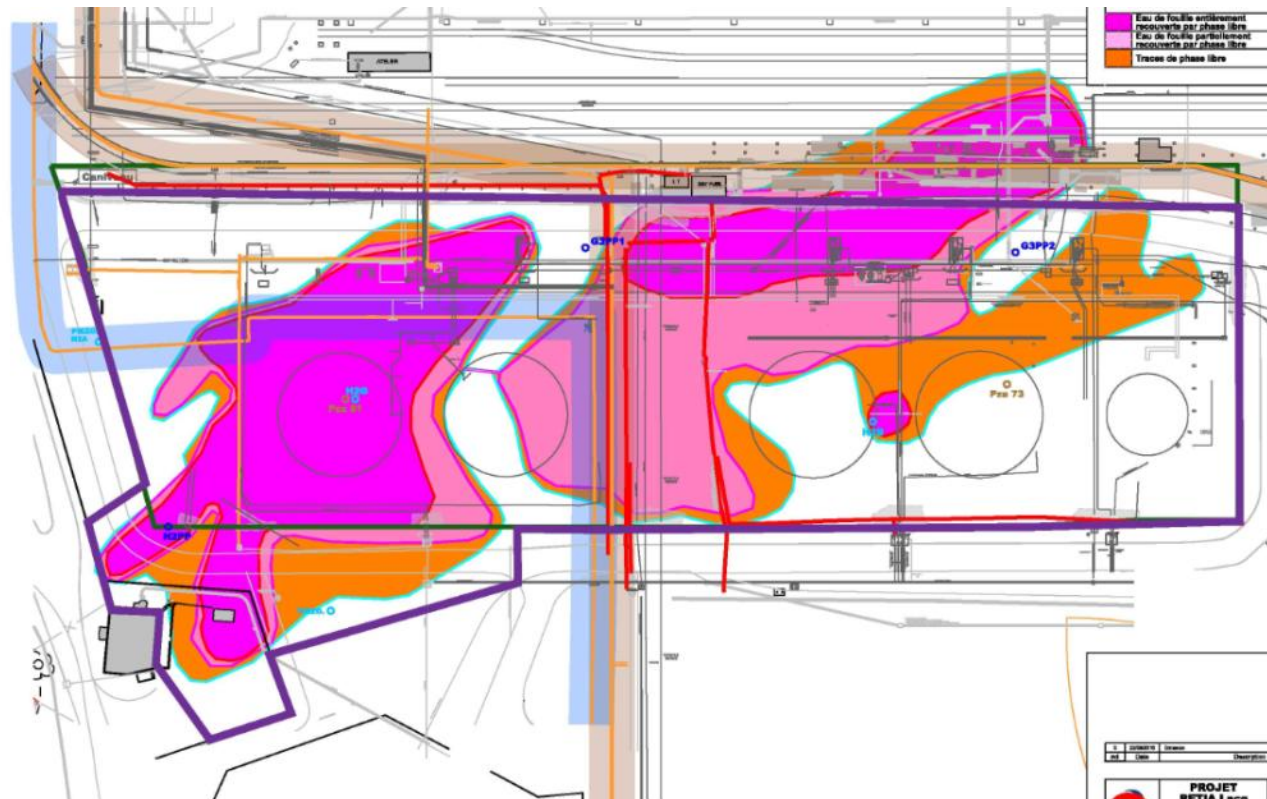

UDL – Réhabilitation – Travaux (3/3) : Terres soufrées

Contrat finalisé avec la société SUEZ pour l'élimination du reste des terres soufrées en Installation de Stockage de Déchets Dangereux (site de Bellegarde - 30)

- 1^{ère} campagne d'élimination terminée, 42 000 tonnes ont été éliminées.



Champs de Lacq

Suivi des DADT



TOTAL

► Synthèse « Suivi des DADT » au périmètre de la concession de Lacq

Titres miniers	Nb DADT	Pré-dossiers DADT remis à l'UT 64	Demandes de compléments	Avis de recevabilité du pré-dossier obtenu	DADT déposée à la préfecture	AP1 reçu	Mémoire de fin de travaux remis	AP2 reçu
Lacq	35	23	16	15	15	8	6	6
